

부동산금융입문 Take-home Exam - 문항 3

재건축 PF사업의 구조적 리스크와 제도적 개선방안

-둔촌주공 사례를 중심으로-

단국대학교 부동산학과

32227373/ 박태환

## 1, 서론 - 문제의식과 사례 선정 이유

과거 저금리와 풍부한 유동성을 바탕으로 부동산 PF 시장은 빠르게 확대되어 왔으나, 이후 금리 상승과 경기 둔화, 공사비 상승 등이 겹치면서 차환 리스크와 금융시장 불안이 반복적으로 부각되고 있다. 특히 단기 유동화증권을 활용한 차환 구조와 시공사 지급보증 중심의 고레버리지 구조는 외부 충격에 대한 취약성을 키워왔다.

이러한 상황 속에서 둔촌주공 재건축 사업은 PF 리스크 관리 측면에서 시사점이 큰 사례로 평가된다. 이 사업은 2024년 11월 ‘올림픽파크포레온’이라는 이름으로 재건축이 완료되었으며, 총 1만 2천 세대 규모로 대한민국 최대 대규모 재건축 단지다. 사업 규모가 큰 만큼 공사비 증액, 분양가 갈등, 금융차환 부담 등 다양한 시행착오가 반복되었고, 정부 정책개입과 금융기관 조정이 복합적으로 작동하며 사업이 정상화되었다.

이에 본 보고서에서는 둔촌주공 재건축 PF 사업을 중심으로 자금조달 구조와 리스크 발생 과정을 살펴보고, 이를 토대로 재건축 PF 구조의 제도적 보완 필요성을 분석하고자 한다.

## 2. 둔촌주공 PF 금융구조 및 사업 경과

<표 2-1> 참여 금융기관 및 이해관계자 요약표

| 구분             | 내용                                     |
|----------------|----------------------------------------|
| 시행주체           | 둔촌주공 재건축조합 (조합직접시행)                    |
| 시공사            | 현대건설, 롯데건설, 대우건설, HDC현대산업개발            |
| PF 자금조달방식      | ABSTB (자산유동화 단기채권) 발행                  |
| 주관사 (1차 조달)    | BNK증권, SK증권, 한투증권                      |
| 주관사 (2차 차환)    | KB증권, 한투증권                             |
| SPC (1차 설립)    | 비앤케이제삼차, 제이부르크제이차, 스톡제오차, 위드지엠제삼차      |
| SPC (2차 차환 설립) | 스타인클라우드, 위드지엠제삼차2, 제이부르크제이차 1, 오메가트러스트 |
| 투자자 신용보강       | 시공사 연대보증 (A1, A2 등급)                   |
| 대주단 규모         | 총 23개 금융기관 (SPC 외 채권 인수 및 투자기관)        |

둔촌주공 재건축사업은 총 사업비 약 4조 2천억 원, 1만 2천 세대 규모로 국내 최대 규모 재건축 사업으로 추진되었다. 시행은 조합이 직접 수행하였고, 시공사로 현대건설, 롯데건설, HDC현대산업개발, 대우건설 등 4개사가 컨소시엄을 구성하여 참여하였다. 대규모 사업비와 복잡한 이해관계 속에서, 본 사업은 일반적인 은행 PF대출이 아닌 유동화 기반 PF 구조를 채택하였다.

### 2-1. 1차 조달 구조

본 사업의 PF 자금조달은 은행권 장기 PF대출 대신 ABSTB(자산유동화 단기채권) 구조를 활용하였다. 이는 SPC(특수목적회사)가 초단기(3개월 내외) 채권을 반복적으로 발행·차환하며 유동성을 유지하는 구조이다. 초기 주관 증권사로 SK증권, BNK투자증권, 한국투자증권 등이 참여하였으며, 각 증권사는 자체 SPC를 설립하여 자금을 유동화하였다.

예를 들어, 비앤케이제삼차(BNK), 제이브루크제이차(SK), 스톡제오차(SK), 위드지엠

제십차(한투) 등의 SPC가 설립되어 약 7,000억 원 규모의 사업비를 1차로 조달하였다. 조합은 이들 SPC로부터 자금을 수령하여 공사비를 집행하였다.

투자자 신뢰 확보를 위해 시공사 4개사는 PF 차입금 전액에 대해 연대보증을 제공하였다. 이로 인해 유동화 채권은 시공사 보증 수준에 따라 A1등급, A2등급으로 발행되어 상대적 신용도를 확보할 수 있었다. 이러한 구조는 금융기관 입장에서는 신용위험을 시공사로 전가하면서도 안정적 투자구조를 형성하였다.

## 2-2. 사업 경과 및 분쟁 발생

2017년 착공 이후 공정률은 35~40%까지 진척되었으나, 공사비 증액 분쟁과 분양가 상한제 적용 협상이 장기화되며 조합-시공사 간 갈등이 심화되었다. 특히 공사비 확정지 분제 계약에도 불구하고 원자재가격 상승 등을 이유로 시공사 측이 증액을 요구하였고, 조합은 이에 대한 대응력이 부족하여 소송 및 협상이 반복되었다.


공사비 증액 분쟁이 해결되지 못한 상황에서 시공사 측은 유치권을 행사하며 공사 중단에 돌입하였다. 공사중단 사태는 금융구조에도 영향을 미쳐, ABSTB 차환에도 부담요인으로 작용하기 시작하였다.

## 2-3. 레고랜드 사태 이후 차환 구조 변화

2022년 하반기 발생한 레고랜드 사태는 자산유동화시장 전반의 유동성 경색을 초래하였고, 둔촌주공 역시 ABSTB 차환 실패 위기에 직면하였다. 기존 주관사였던 SK증권, BNK투자증권은 리스크 회피를 위해 사업에서 이탈하였고, 이후 KB증권, 한국투자증권 등이 새로 참여하며 SPC 재편이 이루어졌다.

구조적으로 기존 SPC의 차환만기가 도래할 때마다 새로운 SPC로 채권이 교체되었으며, 예를 들어 현대건설 몫의 1차 SPC였던 비엔케이제십차는 2차 차환 시 스타인클라우드(KB증권)로 변경되었다. 이 과정에서도 연대보증 구조는 그대로 유지되었다. 정부는 직접 ABSTB를 매입하지는 않았으나, 채권시장안정펀드(채안펀드)를 가동하여 ABCP 매입을 통해 단기유동성 경색을 해소하며 차환시장을 간접적으로 안정화하였다. 이를 통해 총 7,231억 원 규모로 ABSTB 차환에 성공하였다.

### <2-1 그림> 차환발행 및 상환구조 변화

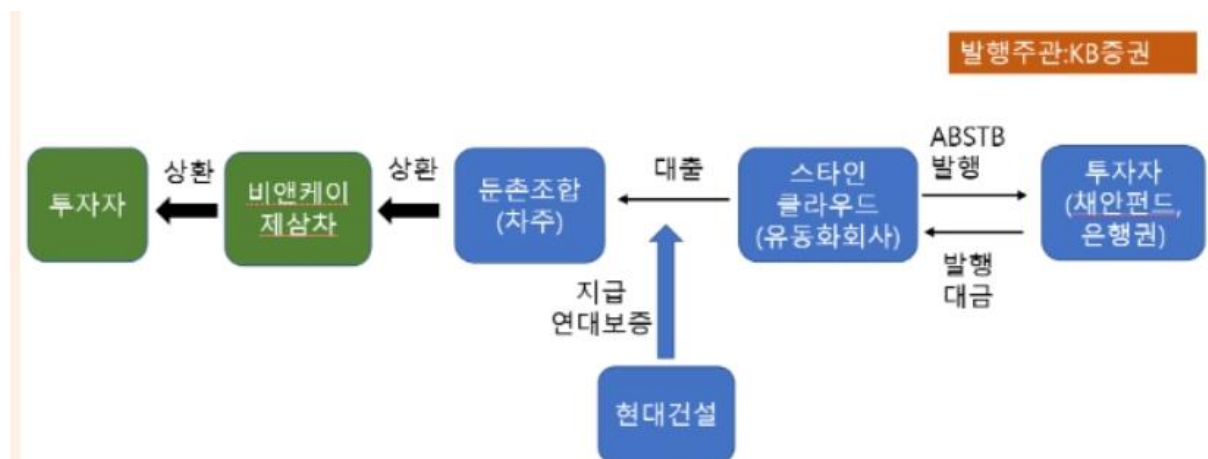

출처: Global Monitor

## 2-4. 일반분양 본계약 단계 유동성 위기 및 HUG 개입

정부의 단기 유동성 공급으로 PF 차환은 일시 안정되었으나, 일반분양 본계약 단계에서 다시 유동성 위기가 발생하였다. 당시 분양가는 전용 59㎡가 최대 10억 6천만 원, 84㎡가 13억 2천만 원 수준으로 책정되었는데, 분양가상한제 적용 하에서 정부의 중도금대출 보증 한도(12억 원)를 초과하는 물량이 상당수 발생하였다. 이로 인해 전용 84㎡ 수분양자의 상당수는 중도금 대출을 받지 못하고 전액 자력조달을 요구받아 계약을 하락이 우려되었다.

일반분양 계약금만으로 PF 만기 상환을 진행하기에는 부족자금 우려가 커지면서, 주택도시보증공사(HUG)가 사업비 대출보증을 통해 긴급 유동성을 공급하였다. HUG 보증을 기반으로 총 7,500억 원이 국내 시중은행 55개 기관으로부터 조달되었고, 이를 통해 PF 만기일에 맞춰 기존 차입금 7,231억 원 전액을 상환할 수 있게 되었다.

## 2-5. 정부 규제완화와 최종 정상화

2023년 1월 정부는 1.3 부동산 대책을 발표하며 수도권 규제지역 해제, 전매제한 완화, 실거주 의무 폐지 추진 등 대규모 규제완화를 시행하였다. 이 정책적 완화 이후 미계약 잔여가구에 대한 무순위 청약 경쟁률이 폭발적으로 상승하며 전체 일반분양도 최종적으로 안정화되었다. 예를 들어 무순위 청약에서는 899가구 모집에 4만 명 이상이 몰리며 평균 46대 1의 경쟁률을 기록하였다.

이후 공사는 정상적으로 완공되어 2024년 11월 '올림픽파크포레온'이라는 명칭으로 준공 및 입주를 개시하였다. 둔촌주공 PF 사례는 SPC-증권사-시공사 보증을 결합한 복합 금융구조, 단기차환 구조의 취약성, 정부의 유동성 개입 및 정책보증 등이 어떻게 유기적으로 작동하는지를 보여준 대표적 시스템 복합구조 사례로 평가된다.

## 3. 둔촌주공 PF 기법의 재무성과 및 위험관리 영향 분석

### 3-1. 재무성과 분석

둔촌주공 재건축 PF 사업의 총사업비는 약 4조 3,677억 원으로 확정되었다. 조합원은 기존 토지 지분 외에 가구당 약 1억 2천만 원씩 총 약 6,500억 원의 추가 분담금을 부담하였다. 일반분양 수익은 약 4조 6,700억 원으로 추정되며, 이를 통해 PF 차입금 약 7,200억 원을 상환하고 금융비용, 공사비 증액분, 운영경비 등을 충당하였다.

회계상 총수입과 사업비를 단순 비교하면 약 9,500억 원 수준의 잉여가 발생하였으나, 실제로는 이자비용과 증액 공사비 지급 등으로 대부분 소진되었고, 조합원 추가분담 최소화를 통해 준공이 완료된 구조로 평가된다. 시공사는 총공사비 4조 3,677억 원 중 약 6% 수준인 약 2,600억 원 가량의 도급이윤을 확보한 것으로 추정된다.

### 3-2. ABSTB 구조의 위험관리 효과

#### 3-2-1. 장점

장점을 네 가지로 도출하였다.

첫째, 시공사 지급보증을 통한 신용보강 효과가 있다. ABSTB 구조에서 시공사가 연대보증을 제공함으로써 유동화 증권의 신용등급이 안정적으로 유지되었다. A1·A2 등급으로 차등 발행되면서 투자자 신뢰 확보 및 투자유치가 원활하게 이루어졌다.

둘째, SPC 분산 발행을 통한 투자위험 분산이 가능하다 다수의 SPC 를 활용하여 차입구조를 다변화하고, 개별 SPC 마다 발행물량을 분산시킴으로써 투자자의 리스크 집중도를 낮추고 채권시장 수용능력을 확대하였다.

셋째, 초단기 차환구조를 통한 유동성 확보가 용이하다. ABSTB 는 만기 3 개월 이내의 단기 유동화채권으로, 시장여건이 정상일 때에는 지속적인 차환을 통해 신속한 자금조달 및 유동성 유지를 가능하게 하였다. 특히 PF 초기단계에서 대규모 자금을 빠르게 집행하는 데 유리하였다.

넷째, 비소구적 PF 기본구조 유지가 가능하다. 채무의 상환책임이 기본적으로 사업 현금흐름을 기반으로 하며, 금융기관이 사업 외부의 추가담보 없이도 일정 안정성을 확보할 수 있는 구조가 성립되었다.

### 3-2-2. 단점

단점 또한 네 가지로 도출하였다.

첫째, 단기 차환의 반복 의존으로 인한 차환리스크 내재화가 있다. ABSTB 구조는 초단기 만기로 반복적 차환을 전제로 하기 때문에, 금융시장 유동성 악화 시 차환실패 위험이 급격히 증폭된다. 이는 시스템 리스크 발생 시 사업 전체의 유동성 위기를 초래할 수 있다.

둘째, 시공사 지급보증 부담 집중으로 인한 우발채무 위험이 있다. 금융기관의 손실이 시공사에 전가되면서, 시공사가 PF 차입금 전액에 대해 직접상환 위험을 부담하게 된다. 특히 금융위기나 분양 부진 상황에서는 시공사의 유동성 위기로 전이될 수 있다.

셋째, 금리 상승에 따른 금융비용 부담이 크다. 단기차환 구조 특성상 금리 상승기에 재조달 금리가 급격히 인상되며, PF 차입에 따른 금융비용 부담이 증가한다. 실제 레고랜드 사태 이후 둔촌주공 PF 차환금리는 7~12%까지 상승하였다.

넷째, 시장 스트레스 발생 시 정부 개입 의존성 강하다. ABSTB 구조 자체만으로는 극심한 금융시장 충격을 스스로 흡수하기 어렵고, 최종적으로 정부의 유동성 지원 및 정책 개입이 필요한 구조적 한계가 노출되었다.

## 4. 둔촌주공 PF 구조의 한계점 및 제도적 개선방안

둔촌주공 재건축 PF는 초단기 차환구조(ABSTB)와 시공사 지급보증이 결합된 구조로 운영되었다. 이 구조는 사업 초기 대규모 자금조달에는 효과적이었으나, 반복적 차환구조가 금융시장 유동성 경색과 금리 변동에 과도하게 노출되는 구조적 한계를 드러냈다. 실제로 레고랜드 사태 이후 차환위기가 현실화되며 사업 전체의 유동성 리스크가 증폭되었고, 시공사들이 우발채무 부담까지 직접 떠안을 위험에 직면하였다.

더 나아가 조합이 시행주체가 되는 현행 구조는 전문성 부족, 공사비 증액 협상 장기화, 의사결정 지연 등으로 이어지며 사업 리스크를 더욱 키우는 결과를 초래했다. 특히 대규모 재건축 PF사업은 대부분 장기화되고 사업기간 동안 수차례 예상하기 어려운 변수에 노출되므로, 금융구조 자체의 한계를 넘어선 보다 제도적이고 구조적인 개선책이 필요한 상황이다.

이러한 배경을 바탕으로, PF 금융구조 자체를 근본적으로 바꾸기보다는 이해관계자의 충돌을 최소화하고 사업관리의 전문성을 확보하는 제도적 방안이 보다 현실적이고 실효성 있는 대안으로 판단된다. 이를 위해 다음과 같은 개선방안을 제안한다.

#### 4-1. 사업시행자형 신탁제도의 적극적 도입

시행주체를 조합이 아닌 신탁사가 맡아 전문성을 확보하도록 하는 **신탁방식 정비사업**이 대안으로 제시될 수 있다. 신탁사는 사업 전반의 사업관리, 자금조달, 공사비 산정, 일정관리 등을 일괄 통제함으로써 조합 내부 갈등과 사업지연을 최소화할 수 있다. 대표적 성공사례로 대전 용운주공 재건축이 있다. 해당 사업은 기존 조합 시행에서 신탁사(한국토지신탁)가 대행자로 참여하면서 1년 만에 사업계획 변경, 관리처분 변경, 철거, 분양까지 정상화되었으며, 약 430억 원의 공사비 절감과 비례율 상승 등 재무성과 개선도 이루어졌다. 이처럼 신탁방식은 금융기관 입장에서 투자 안정성을 높여 금융비용 부담을 줄이는 부수적 효과도 기대할 수 있다.

#### 4-2. 공사비 분쟁조정제도의 상시화

대규모 정비사업에서는 물가상승, 자재비 상승, 인건비 증가 등으로 인한 공사비 증액요구가 빈번히 발생하고, 이로 인해 조합-시공사 간 협상이 장기화되는 문제가 반복된다. 이를 완화하기 위해 정부 및 지자체가 운영하는 **전문가 파견 공사비 분쟁조정제도**를 적극 상시화할 필요가 있다. 실제 **대구 범어우방 1차 사례**에서는 전문가 파견을 통해 공사비 증액 갈등이 조기에 봉합되어 사업이 정상화된 바 있다. 전문가의 원가 검증 및 협상 지원을 통해 불필요한 사업중단 리스크를 예방하고 사업 일정을 안정화시킬 수 있다.

#### 4-3. PF 금융구조 개선 자체는 현실적으로 제약이 크다.

반복적인 단기 차환구조가 금융시장 변동성에 취약하다는 문제의식은 존재하나, 건설비 급등·인플레이션 등 외부 불확실성을 반영하려는 금융기관 입장에서는 단기 차환구조를 선호할 수밖에 없는 구조적 특성이 있다. 따라서 PF 구조를 획기적으로 혁신하기보다는 정부의 지원 등 공적 유동성 안전망을 보완적으로 유지하면서, 사업 내부 이해관계의 충돌을 제도적으로 통제하는 방안이 보다 실질적이고 현실적인 정책·경제적 개선책이 될 것이다.

## 참고문헌

1. Global Monitor. (2023). 「둔촌주공 PF 차환발행 및 상환구조 변화 분석」.
2. 주택도시보증공사(HUG) 보도자료 및 사업보고서.
3. 국토교통부. (2023). 「1.3 부동산 대책」.
4. 대전 용운주공 재건축 사례 참고: 한국토지신탁 사업보고서.
5. 대구 범어우방 1차 사례: 대구광역시 정비사업 분쟁조정 사례집.
6. 강정규 외. (2023). 「국내 부동산 PF 금융구조의 한계와 개선방안」, 부동산연구 제43권 제1호.
7. 한국금융연구원. (2023). 「레고랜드 사태가 국내 자산유동화시장에 미친 영향 분석」.
8. 금융감독원. (2023). 「부동산 PF 관련 리스크 점검자료」.

## 생성형 AI 활용 내역

- AI가 제시한 초안은 전체 구조 파악에 유용하였으나, 과도하게 일반론적 설명이 반복되는 경향이 있어, 한국 PF 시장의 실제 금융기관 사례, SPC구조, 시공사 지급보증 리스크 등을 추가 보완함.
- 생성형 AI가 제시한 '제도개선 방안'은 참고 수준에서 활용하고, 대전 용운주공 및 대구 범어우방 1차 사례 등은 직접 자료 검색 및 실사례 분석을 통해 보강함.
- 금융기관 관점의 우발채무, 초단기 차환구조의 금리 민감도 등은 별도 참고문헌을 통해 보충 분석함.
- AI 결과물은 그대로 활용하지 않고, 반드시 본인의 실증적 자료조사와 비판적 검토를 병행하여 작성함.
